



नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

आ.ब.२०७३।७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान
समिति ([MDAC](#)) को बैठक


२०७३ पुस १०



आ.ब. २०७३/७४ मा बजेट व्यवस्था

चालू खर्च : रु. ४,३८,०६,६१,०००।-
पूँजीगत खर्च: रु. १,५३,२३,१७,०००।-
वित्तीय व्यवस्था: रु. १९,३४,०७,०२,०००।-
जम्मा रु. २५,२५,३६,८०,०००।-

आ.ब.२०७३/७४ को बजेट

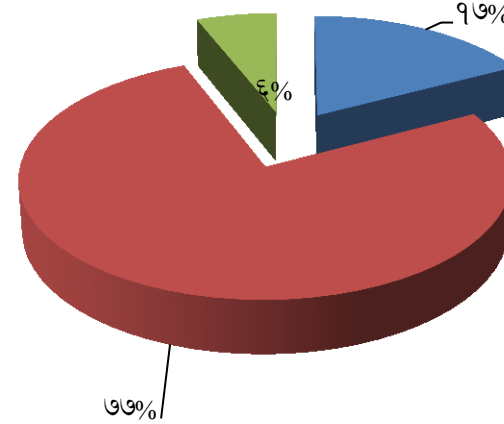

■ चालू खर्च
■ पूँजीगत खर्च
■ वित्तीय व्यवस्था



मन्त्रालयको बजेट व्यहोर्ने स्रोतहरू




आ.ब. २०७३/७४

नेपाल सरकार: रु.१४,५२,१८,३३,०००।-

बैदेशिक अनुदान: रु.१७,५२,४,४७,०००।-

बैदेशिक ऋण: रु.८,९७,९४,००,०००।-


जम्मा: रु.२९,२९,३६,८०,०००।-

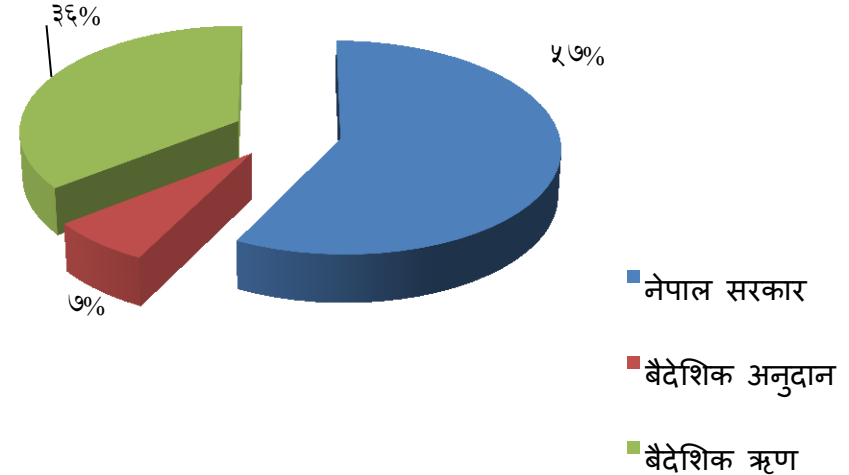




३ वर्षको प्रथम चौमासिक खर्च स्थिति

आ.ब. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक पूँजीगत खर्च
प्रतिशत: १७.८६

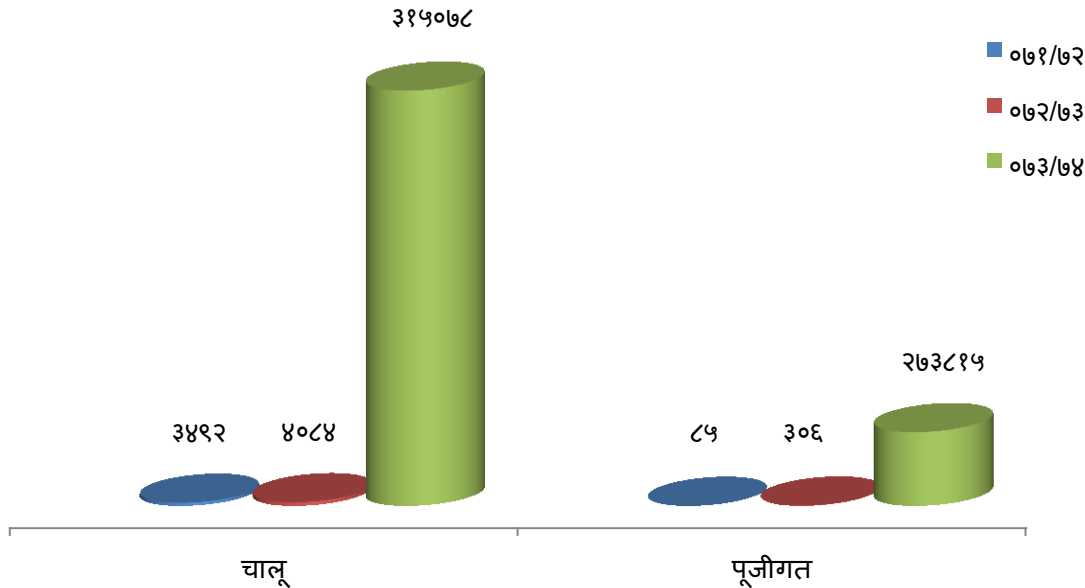



प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रम

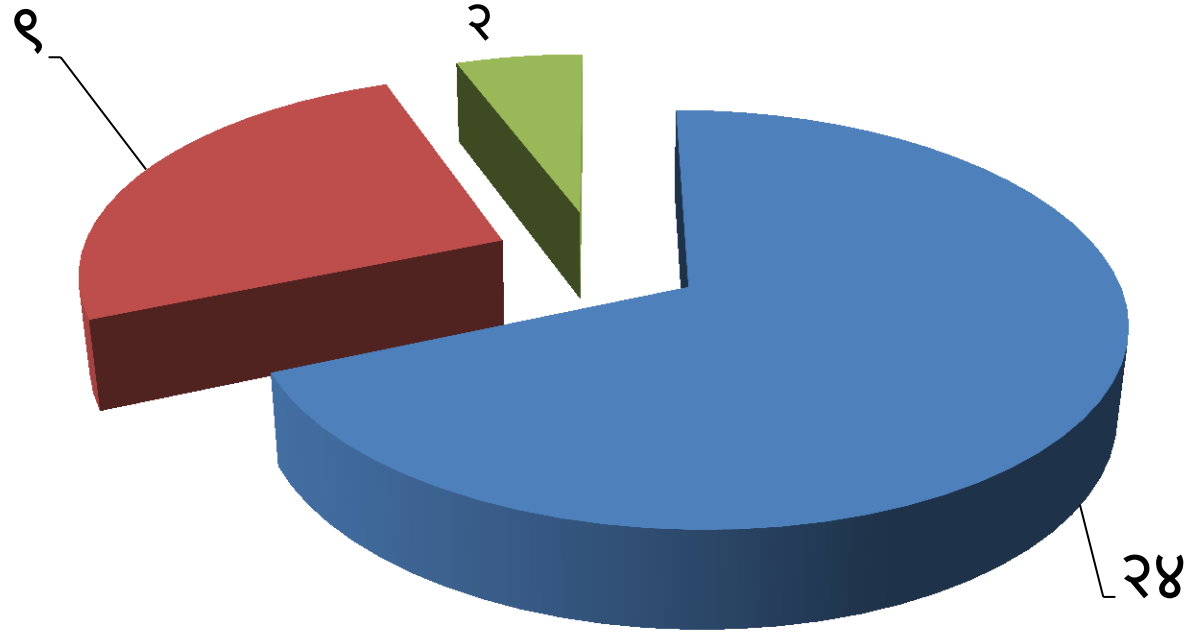

■ पहिलो प्राथमिकता ■ दोस्रो प्राथमिकता ■ तेस्रो प्राथमिकता



राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति

क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रम (५ वटा)	प्रगति प्रतिशत		मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास
		भौतिक	वित्तीय			
१.	गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा बार्षिक बजेट ७,२७,०१,५५ हजार	३०	२५%	<ul style="list-style-type: none">४२८ बिघा जग्गा अधिग्रहण कार्य मूल्यांकनका क्रममा रहेको।रनवे निर्माण कार्य २६% सम्पन्न।CNC/ATM उपकरण जडान गर्न Bid Invitation को क्रममा रहेकोडिजाइन तथा सुपरभिजन एवं परामर्श सेवा लक्ष्य अनुरूप भइरहेको।Dedicated Electricity Fedder Line जडान टेण्डर प्रक्रियामा जाने क्रममा रहेको।	<ul style="list-style-type: none">Dedicated Electricity Fedder Line जडान ने.वि.प्रा. भैरहवाबाट टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्नेमा ढिलो भएको।प्राप्त विद्युतमा Voltage drop हुने।	<ul style="list-style-type: none">म.प. बाट निर्णय भइ सहजीकरण गर्ने काम भएको।ने.वि.प्रा.बाट टेण्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा लिएको।Voltage regulate गर्ने बैकल्पिक प्रयास भएको।
२.	पोखरा विमानस्थल	२०%	२५%	<ul style="list-style-type: none">गत वर्षको मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तथा चालु आ.व. को जग्गा अधिग्रहणको लागि नयाँ सर्भे कार्य सम्पन्न।	Escrow Account खोल्न बाँकी भएकोले Loan effective हुन नसकेको।	Escrow Account खोली Loan effective का लागि प्रयास भइरहेको।



राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति क्रमशः



क्र. सं.	आयोजना/ कार्यक्रम	प्रगति प्रतिशत		मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास
		भौतिक	वित्तीय			
३.	दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	१५%	०	<ul style="list-style-type: none">जग्गा पहिचान सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य सम्पन्न।मुआब्जा बितरणको लागि जग्गा पहिचान गरि दररेट निर्धारण कार्य भईरहेको ।		
४.	पशुपति क्षेत्र विकास	२५%	१४%	<ul style="list-style-type: none">वृहद् पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्श सेवा लिन आवश्यक कार्य भैरहेको,भण्डारखाल बगैचाको विकास र भस्मेश्वर सत्तलको निर्माण कार्य सम्झौताको चरणमा रहेको ।वनकाली वगैचा, भण्डारखाल वगैचा, हंसमण्डप प्रांगण निर्माण लगायतका अन्य कार्यहरू भइरहेको ।		
५.	लुम्बिनी क्षेत्र विकास	७%	१०%	<ul style="list-style-type: none">गुरुयोजना अनुसारका केही कार्यहरू शुरुवात गरिएको ।		



पहिलो प्राथमिकता (P1) कार्यक्रमहरुको प्रगति

(रु.हजारमा)



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तिय		
१.	३२५०११	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२१५५८५	२९५७८	५१	५०	२१७९८	७४
२.	३२५०१२	पर्यटन कार्यालयहरु - ७ वटा	३४७०५	१६३५३	३५	१०	९८००	६०
३.	३२५०१३	पुरातत्व विभाग	२४३९११	१३०३५	२२	५	१३२००	१००
४.	३२५०१४	राष्ट्रिय अभिलेखालय	५०१०३	८३५७	१६	११	५४४१	६५
५.	३२५०१५	राष्ट्रिय संग्रहालय	२६३४६	८४८०	५१	१९	५०७७	६०
६.	३२५०१६	राष्ट्रिय कला संग्रहालय	१०५८४	२९६३	२८	१७	१७९५	६०
७.	३२५०१७	क्षेत्रीय संग्रहालयहरु	४४६०८	६५२५	१००	१२	५३८६	८३
८.	३२५०१८	संग्रहालयहरु (जातिय संग्रहालयहरु समेत)	४६०७८	४५४४	२५	७	३०००	६६



पहिलो प्राथमिकता (P1) कार्यक्रमहरुको प्रगति क्रमशः

(रु. हजारमा)



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तीय		
९.	३२५०१९	ऐतिहासिक दरबारहरु	७३१६२	१७७३४	३०	३	१८५०	१०
१०.	३२५०२०	केन्द्रिय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला	११२२१	३६०७	१६	११	५४५१	१५१
११.	३२५०२१	नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय	१०५०७	३७०३	८१	४९	१८०२	४९
१२.	३२५०२२	नारायणहिटी दरबार संग्रहालय	८६९३१	२४६६५	१	९८	२४९०७	१०१
१३.	३२५०२३	स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय	५७०५	१९३६	१००	३६	२४४१	१२६
१४.	३२५०२४	पर्यटन विभाग	१०८८६६	४१४०२	७९	६	२२९८५	५६



पहिलो प्राथमिकता (P1) कार्यक्रमहरुको प्रगति क्रमशः (रु.हजारमा)



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तिय		
१५.	३२५१०६	पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१२८१६०१	३३५८७९	१७	४९	१६४२६४	४९
१६	३२५१११	पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना	२९२३८७	३४१५	१००	१	२०००	५९
१७	३२५११२	विश्व सम्पदा क्षेत्र संरक्षण आयोजना	१७६८०	९९३	१००	२	४००	४०
१८	३२५११४-३	बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्	१०००००	२१६५	तालाबन्दी भएको जानकारी प्राप्त भएको र प्रगति प्राप्त नभएको ।			
१९	३२५११५-३	पशुपति क्षेत्र विकास कोष	४०७५००	१२५५००	२५	१४	५५०००	४४
२०	३२५११६	लुम्बिनी विकास कोष	६६००००	१५२९६६	१०	७	४३३००	२८
२१	३२५१२२	यातायात(हवाई)आयोजना तयारी सुविधा	४३८३५०	१४६११६	२८	०१.३४	५७७.६७	०.१३



पहिलो प्राथमिकता (P1) कार्यक्रमहरुको प्रगति क्रमशः (रु.हजारमा)



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तीय		
२२	५०११०१-५	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण	१३०९७०२	५४१२	६८.८३	१.५९	२०८४६	७.२१
२३	५०११७९	पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	५००००००	१००००००	२०	२५	३२१००	३
२४	५०११८०	दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल	१५०००००	०	१५	०	०	०



दोश्रो प्राथमिकता (P2) कार्यक्रमहरुको प्रगति

(रु.हजारमा)



क्र. सं.	ब.उ.शि. नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तीय		
१	३२५१०२	नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान	२५४९८	७७१६	८०	७९	७७१६	१००
२	३२५१०८	दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (मन्त्रालय)	४१०४४३	१०८२०८	१००	३५	१०२८०४	९५
३	३२५११३	संस्कृति प्रबर्द्धन कार्यक्रम	१०९५१८२	१०१००	३३	०.९२	११३०	११.१८
४	३२५११८	नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान	९५७००	३१८८२	७२	७२	२२८००	७२
५	३२५११९	नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान	४५९००	१३५९६	८०	८०	७९०४	५८
६	३२५१२०	नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान	५४२३६	१६३६०	३८	२८	१३४२३	८२



दोश्रो प्राथमिकता (P2) कार्यक्रमहरुको प्रगति क्रमशः

रु.हजारमा



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तिय		
७	३२५१२१	इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान	३५८९	९८१	१००	१००	३५८९	३६६
८	५०११३६-५	हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि	४३११०००	२१८७०	२८	१	५७७६७	२६४
९	५०११६१ (CAAN)	दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजना	७२२००००	१०६००	१००	०.१६	११९११	१००



तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त(P3) कार्यक्रमहरुको प्रगति

रु.हजारमा



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना/कार्यक्रम	बार्षिक बजेट	प्र. चौ. बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति		जम्मा खर्च	प्र.चौ.खर्च प्रतिशत
					भौतिक	वित्तिय		
१	३२५१०४-३	हवाई सुरक्षा तथा हवाई व्यवस्थापन कार्यक्रम	७७००	३१९९	५०	४५	१४२४	४५
२	३२५११७-३	सांस्कृतिक संस्थान	८९००	४२००	१००	४७	४२००	१००



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति



१. पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (३२५१०६)

भौतिक प्रगति: १७%
वित्तीय प्रगति: ४९%

- स्वीकृत बार्षिक बजेट : रु. १,२८,१६,०१ हजार
- प्रथम चौमासिक बजेट: रु. ३३५८७९ हजार
- प्रथम चौमासिक खर्च: रु. १६४२६४ हजार

प्रमुख कार्यहरु

- ४ वटा ठुला ट्रेकिङ्ग ट्रेलको बहुवर्षिय खरिद योजना स्विकृतिको चरणमा रहेको।
- पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न विकास समितिलाई प्रथम चौमासिक बापतको रु ४ करोड ९१ लाख ८५ हजार निकाशा दिइएको तथा ९ वटा जिविस मार्फत पर्यटन पूर्वाधारका कार्यका लागि रु ४ करोड ८५ लाखको अख्तियारी पठाईएको ।
- पर्यटन विभागबाट विभिन्न १४ जिविसहरु मार्फत पर्यटन पूर्वाधारका कार्यका लागि रु ३ करोड ९९ लाखको अख्तियारी पठाईएको ।
- ल.इ. तयार भइ सम्झौताको चरणमा रहेको, निर्माण कार्यको लागि मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको, स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न ।



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति स्थिति क्रमशः



१.	<u>पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना</u> (३२५१०६)	<p><u>प्रमुख कार्यहरू क्रमशः Great Himalaya Trail अन्तर्गत</u></p> <ul style="list-style-type: none">• १५ वटा आयोजना मध्ये ५ वटा आयोजनाको अख्तियारी जि.वि.स. पठाईएको, ३ वटा आयोजनाको बहुबर्षिय योजना स्विकृती भएको ।• गोर्खा जिल्लाको ल्हो-सामा-साम्दो-लार्केपास हुंदै भिम्ताङ्ग-मनाङ्ग जाने पदयात्रा मार्ग निर्माणको कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न । <p><u>अन्य</u></p> <ul style="list-style-type: none">• नेपाल पर्वतिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानवाट डोल्पा जिल्लामा पर्वतारोहण तथा ट्रेकिंग सम्बन्धी घुम्टि तालिम सम्पन्न ।• उत्कृष्ठ होमस्टे पुरस्कार वितरण होमस्टे छनौटको मापदण्ड तथा कार्यबिधि तयार गरिएको ।
----	---	---



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति क्रमशः

२.	<p>पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना (३२५१११) भौतिक प्रगति: १०० वित्तीय प्रगति: १ %</p>	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. २९२३८७ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. १९९४ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. २००० हजार <p>प्रमुख कार्यहरु:</p> <ul style="list-style-type: none">पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजनामा समावेश भएको सम्पदा संरक्षण कार्यको २२८ वटा कार्यक्रम मध्ये १० वटा सूचना प्रकाशनको क्रममा रहेको, ४ वटा कोटेशनका कार्यहरु कार्यादेश भैसकेको, १२ वटा ल.इ. स्वीकृतिको क्रममा रहेको र अन्य स्थलगत निरीक्षण भइ ल.इ. तयार भइरहेको ।
----	---	---



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको प्रगति स्थिति

क्रमशः



३.	विश्व सम्पदा स्थल क्षेत्र संरक्षण आयोजना (३२५११२) भौतिक प्रगति: १०० % वित्तीय प्रगति: २ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट : रु. १७६८० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ९९३ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ४०० हजार <p>प्रमुख कार्यहरू</p> <ul style="list-style-type: none">विभिन्न २३ वटा क्रियाकलापहरू मध्ये २ वटा निर्माण सम्पन्न, ५ वटा निर्माण कार्यको लगत ईष्टिमेटको कार्य भएको । सूचनाको क्रममा ३ वटा, अन्य TOR तयार भइरहेको ।
४.	बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् (३२५११४)	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. १००००० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. २१६५ हजारप्रथम चौमासिक निकाशा नलिएको <p>प्रमुख कार्यहरू</p> <p>प्रगति प्राप्त नभएको</p>



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति

क्रमशः



७.	नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय (३२५०२१) भौतिक प्रगति: ८१ % वित्तीय प्रगति: ४९ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. १०५०७ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ३७०४ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. १८०२ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">-सचेतनामूलक अन्तर्कृत्या कार्यक्रम सम्पन्न,-पूँजिगतखर्च अन्तर्गतका स्कूटर १, ल्यापटप १, कम्प्युटर १ खरिद भएको ।-रोयल्टी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठक सञ्चालन भएको र रोयल्टी सम्बन्धी संस्थाहरुलाई थप क्रियाशील बनाइएको ।
८.	नारायणहिटी दरबार संग्राहलय (३२५०२२) भौतिक प्रगति: १ % वित्तीय प्रगति: ९८ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट : रु. ८६९३१ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. २४६६५ हजारप्रथम चौमासिक निकाशा: रु .२४६६५ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">• विभिन्न २५ वटा क्रियाकलापहरु मध्ये निर्माण चालु ४ वटा, अन्य ल इ तयार भइरहेको ।



पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति

९.	यातायात (हवाई) आयोजना तयारी सुविधा (३२५१२२) भौतिक प्रगति: २२% वित्तीय प्रगति: १.३४%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ४३८३५० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. १४६११६ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ५७७.६७ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्य
१०.	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (शेयर लगानी) (५०११०१) भौतिक प्रगति: ६८.८३ % वित्तीय प्रगति: ७.२१ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. १३,०९,७०२ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ५४,१२ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. २०८४६ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु:</p> <ul style="list-style-type: none">ईलाम, अर्घाखाँची, गुल्मी, कालिकोट, खिजीचण्डेश्वरी र लमजुङ्गमा विमानस्थल निर्माणको कार्य भै रहेको ।बिराटनगर, लामिडाँडा, रारा (मुगु) डोटी र धनगढी विमानस्थलको पहिलो चौमासिकको लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पन्न ।



दोस्रो प्राथमिकताका (P2) आयोजना/ कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति



९.	नेपाल पर्यटन तथा होटल ब्यवस्थापन प्रतिष्ठान (३२५१०२) भौतिक प्रगति: ८०% वित्तीय प्रगति: ७९%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. २५४९८ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ७७१६ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ७७१६ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक कक्षा भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको ।
१०.	दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (मन्त्रालय) (३२५१०८) भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ३५%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ४१०४४३ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. १०८२०८ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. १०२८०४<ul style="list-style-type: none">चालू खर्च: रु. १०१४५१ हजारपूजीगत खर्च: रु. १३५३ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">पेरामर्श खर्च, तथा मेशिनरी औजार खर्चसफ्टवेयर निर्माण, फर्निचर खरिद आदि कार्य भएको



दोस्रो प्राथमिकताका (P2) आयोजना/ कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति

<p>११.</p>	<p>संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम (३२५११३)</p> <p>भौतिक प्रगति: ३३ % वित्तीय प्रगति: ११.१८ %</p>	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट : रु. १०९५१८२ हजारप्रथम चौमासिक बजेट : रु. १०१०० हजारप्रथम चौमासिक खर्च : रु. ११३० हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लागत विभाजनमा परेका प्रतिष्ठान तथा अन्य सम्पदाको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरु मार्फत जम्मा रु. ६० करोड अख्तियारी पठाई सकिएकोमहाकवि देवकोटा पुरस्कार वितरणका लागि नाम चयन भईसकेको ।युनेस्को काठमाण्डौको सहकार्यमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा (ICH) सम्बन्धी ५ दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ।
<p>१२.</p>	<p>नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान (३२५११८)</p> <p>भौतिक प्रगति: ६५ % वित्तीय प्रगति: ८१ %</p>	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट रु ९५७०० हजारप्रथम चौमासिक बजेट रु ४१८८२ हजारप्रथम चौमासिक निकाशा रु हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु २२८०० हजार <p>प्रमुख कार्यहरु:</p> <ul style="list-style-type: none">पूँजीगत तर्फका सवै ५ वटा र चालू तर्फका सवै ४० वटा कार्यक्रमहरु चालू रहेको ।



दोस्रो प्राथमिकताका (P2) आयोजना/ कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति



१३.	नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (३२५११९) भौतिक प्रगति: ८०% वित्तीय प्रगति: ८०%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ४५९०० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. १३५९६ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ७९०४ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">मेशिनरी फर्निचर खरिदचित्रकला, हस्तकला, लोककला, आदिको प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न।
१४.	नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान (३२५१२०) भौतिक प्रगति: ३८ % वित्तीय प्रगति: २८ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ५४२३६ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. १६३६० हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. १३४२३ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">फर्निचर, मेशिनरी, कला सम्बन्धी पुस्तक खरीद गरिएको ।क्षेत्रीय नृत्य, नाट्य विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न।योगेश बर्द्व र दिलमाया खातिको जीवनी प्रोफाइल तयार ।



दोस्रो प्राथमिकताका (P2) आयोजना/ कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति



१५.	ईच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान (३२५१२१) भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: १००%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ३५८९ हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ९८१ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ३५८९ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">सभाहल निर्माण भएको ।कविता गोष्ठी सम्पन्न भएको ।
१६.	हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना (५०११३६) भौतिक प्रगति: २८ % वित्तीय प्रगति: १ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ४३११००० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. २१८७० हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ५७७६७ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">परामर्शदाताबाट कार्यको सुपरीवेक्षण भइरहेको ।नेपाल सरकारबाट १४९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्राप्त भई सो जग्गाहरुको मुआब्जा वितरण भइरहेको ।




तेस्रो प्राथमिकताका(P3) आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति स्थिति

१८.	हवाई सुरक्षा तथा हवाई व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२५१०४) भौतिक प्रगति: ५० % वित्तीय प्रगति: ४५ %	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ७७०० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ३१९९ हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. १४२४ हजार <p>प्रमुख कार्यहरु:</p> <ul style="list-style-type: none">हवाई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिबेदनहरुको Digitization कार्य सम्पन्नभरतपुर विमानस्थलमा सेवासुबिधा तथा गुणस्तर सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको
१९.	सांस्कृतिक संस्थान (३२५११७) भौतिक प्रगति: १००% वित्तीय प्रगति: ४७%	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत बार्षिक बजेट: रु. ८९,०० हजारप्रथम चौमासिक बजेट: रु. ४२०० हजारप्रथम चौमासिक खर्च: रु. ४२०० हजार <p>प्रमुख कार्यहरु</p> <ul style="list-style-type: none">भवन तथा प्रेक्षालय मर्मतका कार्यहरु भैरहेको ।विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम भैरहेको ।



प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको समष्टि प्रगति

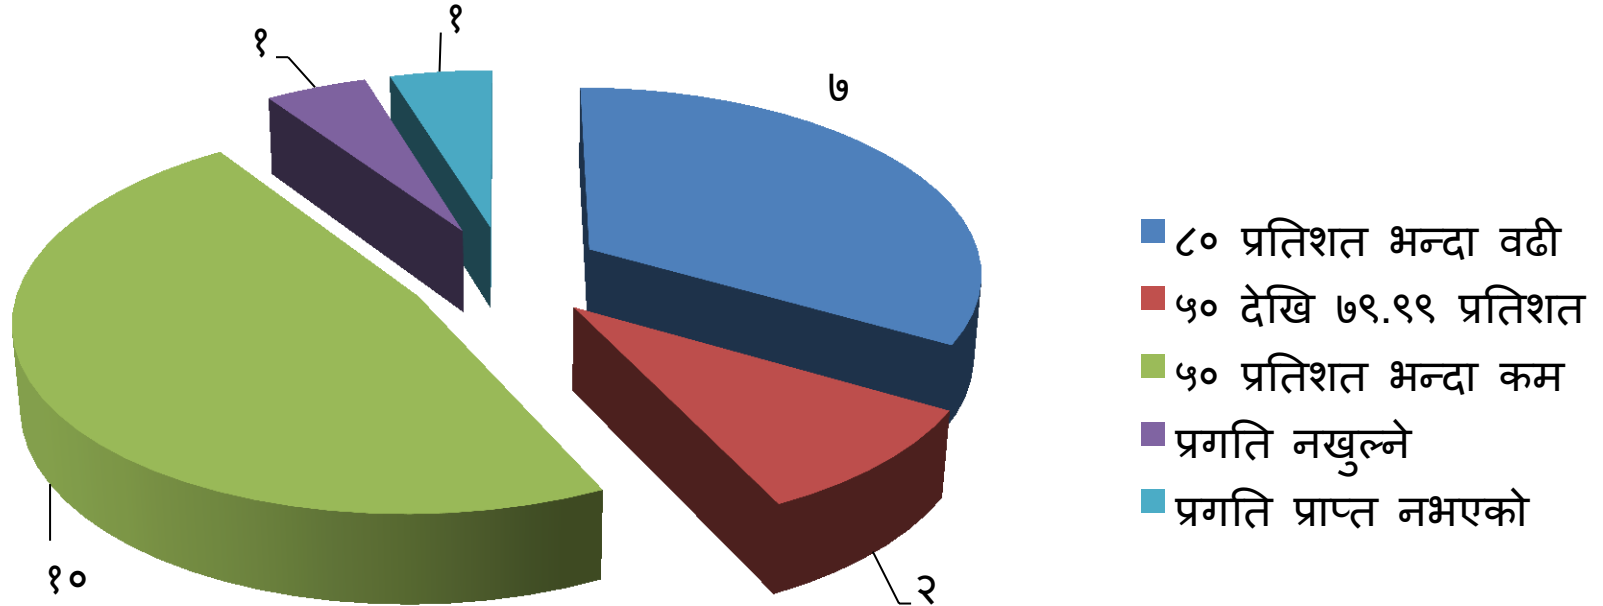

औषत भौतिक प्रगति: ४८.४ प्रतिशत
औषत वित्तीय प्रगति: ५०.९ प्रतिशत



क्षतिग्रस्तको संरचनाको पूनर्निर्माणतर्फ

<p>१. पूनः निर्माण कार्यक्रम (३०१८०१)</p> <p>भौतिक प्रगति: ८२.७% वित्तीय प्रगति: ९६.८३%</p>	<ul style="list-style-type: none">स्वीकृत वार्षिक बजेट रु. ७९,४९,३६ हजार मा पुर्जीगत ७५०००० हजार रहेको ।प्रथम चौमासिक खर्च रु. ३६९३१ हजार <p><u>प्रमुख कार्यहरु : पुरातत्व विभाग अन्तर्गत</u></p> <ul style="list-style-type: none">बौद्धनाथको पुनःनिर्माण र प्याङगाउँ पाटी संरक्षण कार्य ललितपुरको कार्य सम्पन्न भएको ।प्रस्तावित मध्ये १३२ वटाको जिम्मेवारी बाँडफाँड भै ४७ वटाको पुनःनिर्माण कार्य शुरू भएको, २५ वटा पुनःनिर्माण कार्यको सूचना प्रकाशन भएको र अन्य कार्यक्रमको ल.ई. स्वीकृतिका क्रममा रहेको ।बुंगमती स्थित मनकामना मन्दिरको भुइँतल्लाको कार्य सम्पन्न भएको ।साँखुस्थित खड्गयोगिनी लगायतको निर्माण कार्य शुरू भएको ।धरहरा पुनःनिर्माणको लागि अर्किटेक्चरल स्टकचरल परामर्शको लागि परामर्शदातासंग मिति २०७३।०२।२४ मा संझौता भएकोमा थप कामका लागि भेरिएशन अर्डर स्वीकृत भएको ।अन्य कार्यहरु ल. ई. तयार भैरहेको ।
---	--



वाह्य सहयोगमा भैरहेका पुनर्निर्माणका कार्यहरु



- यूनेस्को काठमाण्डौं कार्यालयको सहयोगमा हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रका क्षतिग्रस्त स्मारकहरुको Wooden Elements हरूको Sorting, Storing / Documentation को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
- भुकम्प पश्चात उपत्यका विश्व सम्पदा स्थलहरुको पुरातात्विक अन्वेषण, उत्खनन् एवं अनुसन्धानको कार्य गर्ने सम्बन्धी वेलायतको दुरहाम विश्वविद्यालयसंग MOU भइ परीक्षण उत्खनन् कार्य भईरहेको
- हनुमानढोका दरवार परिसरको नौतले दरवार (लौहचोक परिसर)को जीर्णोद्धार कार्य दरवार परिसरका क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको संरक्षण तथा पुनःनिर्माण कार्य गर्न नेपाल सरकार र चीन सरकार विच सम्झौता भई संरक्षण कार्य अगाडी बढेको ।
- ललितपुर जिल्ला बुङ्गमतिस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथ श्रीलंका सरकारसंग सम्झौता भइ जग खन्ने कार्य शुरू गरिएको ।
- Heritage and environment conservation foundation Kathmandu Nepal संग अध्ययन तथा संरक्षण कार्य गर्न संझैता भइ चाँगुनारायण मन्दिर परिसरको किलेश्वर मन्दिर कार्य सम्पन्न भएको, लक्ष्मीनारायण र चौधेराको पुनःनिर्माण कार्य भईरहेको ।
- भक्तपुरको कला संग्रहालय (लाल बैठक), नृत्य बत्सला मन्दिर, पूजारीमठ जर्मन सरकार र भक्तपुर नगरपालिका विच सम्झौता भई कार्य शुरू भएको ।



पुनःनिर्माणको प्रगति क्रमशः



पर्यटन विभाग अन्तर्गत:

- लामटाङक्षेत्र, हेलम्बुक्षेत्र, मकालुबरुण र लखनपुर-सानुसैलुङ पदयात्रामार्ग पुन निर्माणको लागि बहुबर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति भई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको ।
- मनास्लु, खुम्बुक्षेत्र, अन्नपूर्ण र मुढे-सैलुङ पदयात्रामार्ग पुन निर्माणको लागि बोलपत्र प्रकाशनको तयारी भैरहेको तर पर्यटन तर्फको कार्यक्रमका लागि बजेट हाल सम्म प्राप्त नभएको ।

पशुपतिक्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत:

- ९ वटा आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भैसकेको, २ वटा आयोजना सम्झौताको चरणमा रहेको, २ वटामा दाता परिचालन गरिएको र ४ वटाको बोलपत्र आह्वानको अन्तिम चरणमा रहेको ।



मन्त्रालयका प्रमुख कार्यहरु

- विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर २७ मा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको । सो अबसरमा होटल, ट्राभल, ट्रेकिंग र हवाई क्षेत्रका सबैभन्दा बढी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चारवटा संस्था र अपाङ्गता भएकाहरुलाई रोजगारी दिने एक संस्थालाई सम्मान गरिएको ।
- प्रदेशगत जनशक्ति स्रोत सम्पत्तिको विवरण र संघियता अनुरूप मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्य विश्लेषण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाईएको ।
- पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न विकास समितिलाई प्रथम चौमासिक बापतको रु ४ करोड ९१ लाख ८५ हजार निकाशा दिइएको तथा ९ वटा जिविस मार्फत पर्यटन पूर्वाधारका कार्यका लागि रु ४ करोड ८५ लाखको अख्तियारी पठाईएको ।
- पर्यटन विभागबाट विभिन्न १४ जिविसहरु मार्फत पर्यटन पूर्वाधारका कार्यका लागि रु ३ करोड ९९ लाखको अख्तियारी पठाईएको ।



मन्त्रालयका प्रमुख कार्यहरु क्रमशः

- भाषा आयोग ऐन, २०७३ को विधेयक कानून मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त भईसकेको ।
- हवाई सुरक्षा नियमावली, २०७३ तर्जुमा गरिएको ।
- धार्मिकस्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको ।
- बिदा पर्यटन कार्यविधि, २०७३ तयार भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् मा पठाईएको ।
- Electronic Attendance र File Tracking System संचालन भैरहेको
- मा. मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू र विभागिय प्रमुखज्यूहरु तथा श्रीमान् सचिवज्यू र महाशाखा प्रमुखहरु बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भई सोको साप्ताहिक कार्ययोजना अनुसार कार्य अगाडी बढेको प्रत्येक शुक्रबार सोको समिक्षा हुने गरेको ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रमुख स्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीयक्षेत्र र गन्तब्यको विकास गर्न गुरुयोजना तयार गर्न र एक एकवटा नमूना शान्ति तथा सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यको अध्ययन गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
- मुक्तिनाथक्षेत्र, ईलामको गजुरमुखीधाम र डडेलधुरा उग्रतारा मन्दिरको गुरुयोजना तयार गर्न अध्ययन सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान गरिएको ।



गुनासो तथा बेरुजु फछौँट सम्बन्धीकार्यहरु



गुनासो तथा उजुरी तर्फ

- हेलो सरकारवाट प्राप्त गुनासाहरुको फछौँट शतप्रतिशत भएको ।
- बिभिन्न निकायवाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत उजुरी, गुनासो, निर्देशनहरु ८२ वटा मध्ये ३० वटा फछौँट भएको ।
- ३० वटा फछौँट कार्य मध्ये २१ वटा उजुरी र गुनासाहरुको छानविन सिमित गठन भई प्राप्त प्रतिक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाईएको र ९ वटाको निर्देशन तथा अन्य विवरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा लेखी पठाईएको ।



प्रमुख उपलब्धिहरु क्रमशः

नागरिक उड्डयनतर्फ



- मिति २०७३।५।२६ मा ICAO Assembly मा सहभागिता र Council मा उम्मेदवार राष्ट्रलाई समर्थन गर्ने सम्बन्धी कार्य ।
- हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धी कार्य ।
- मिति २०७३।६।७ मा नेपाल सरकार मा.मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार दुर्गम क्षेत्रको हवाई उडानमा सहूलियत भाडा प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य सम्पन्न ।
- नेपाल वायुसेवा निगमको कर्मचारीहरुको सेवासर्श सम्बन्धी विनियमावली २०५८ संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय मिति २०७३।५।२४ को निर्णयानुसार कार्य सम्पन्न ।
- नेपाल सरकार मा.मन्त्रीस्तरको २०७३।५।११ को निर्णयानुसार बुद्ध एयर प्रा.लि.लाई वायुयान तथा वायुयानका पार्टपूजा मर्मत सम्भार संस्था (MRO) संचालन गर्न इजाजत जारी गरिएको ।
- वायुसेवा अनुगमन सम्बन्धी Checklist बनाई कार्यान्वयन भएको ।
- Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) Workshop मा प्राविधिक जनशक्तिलाई सहभागी गराइएको ।
- 7 December, 2016 का दिन विविध कार्यक्रम गरी ICAO Day मनाइएको ।



नेपाल बायुसेवा निगमबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरु



- आन्तरिक तथा बाह्य उडानबाट रु. ३८३५९ लाख आम्दानी गरेको (अपेक्षित लक्ष्यको ७२ प्रतिशत)
- चिनिया विमान(MA60 र Y12 E) तथा A330-200 विमान खरिद प्रकृत्यामा रहेको ।
- विभिन्न पदमा ५६ जना नयां कर्मचारी भर्ना गरिएको ।
- १५ जना पाइलटहरुलाई सिमुलेटर तालिमको लागि विदेश पठाएको ।



नेपाल पर्यटन बोर्ड




- UBM India Private Limited द्वारा भारतमा आयोजना गरिएको SATTE Mumbai 2016, Travel and Tourism Fair (TTF) 2016 Business and Luxury Travel Mart (BLTM) 2016 तथा Express Tourism and Hospitality Expo 2016 मा पर्यटन व्यवसायी सहित सहभागी भई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको ।
- जापानको टोकियोमा आयोजना गरिएको पर्यटन मेला JATA 2016 मा नेपालका पर्यटन व्यवसायी कम्पनीहरु सहित सहभागी भई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको । नेपाल जापान दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा जापानी पर्यटकहरुलाई बिशेष छुटको ब्यवस्था गरिएको ।
- छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको सियान शहरमा China Xian Silk Road International Travel Exhibition,(CSXRITE) 2016 र कुन्मिङ्ग शहरमा China International Travel Mart (CITM) 2016 मा नेपालका पर्यटन व्यवसायी कम्पनी सहित नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको ।
- पर्यटन मेला फ्रान्सको पेरिसमा संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा वर्षेनी आयोजना हुने विश्वकै ठूलो B2B पर्यटन मेला World Travel Market (WTM) मा २४ वटा निजी पर्यटन व्यवसायी कम्पनीहरु सहित सहभागिता जनाई विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको । साथै नेपाली राजदूतावास, लण्डन, बेलायतद्वारा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनबहादुर शाहीको उपस्थितिमा राजदूतावासमा Nepal Evening कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको ।



राजस्व आम्दानी



—

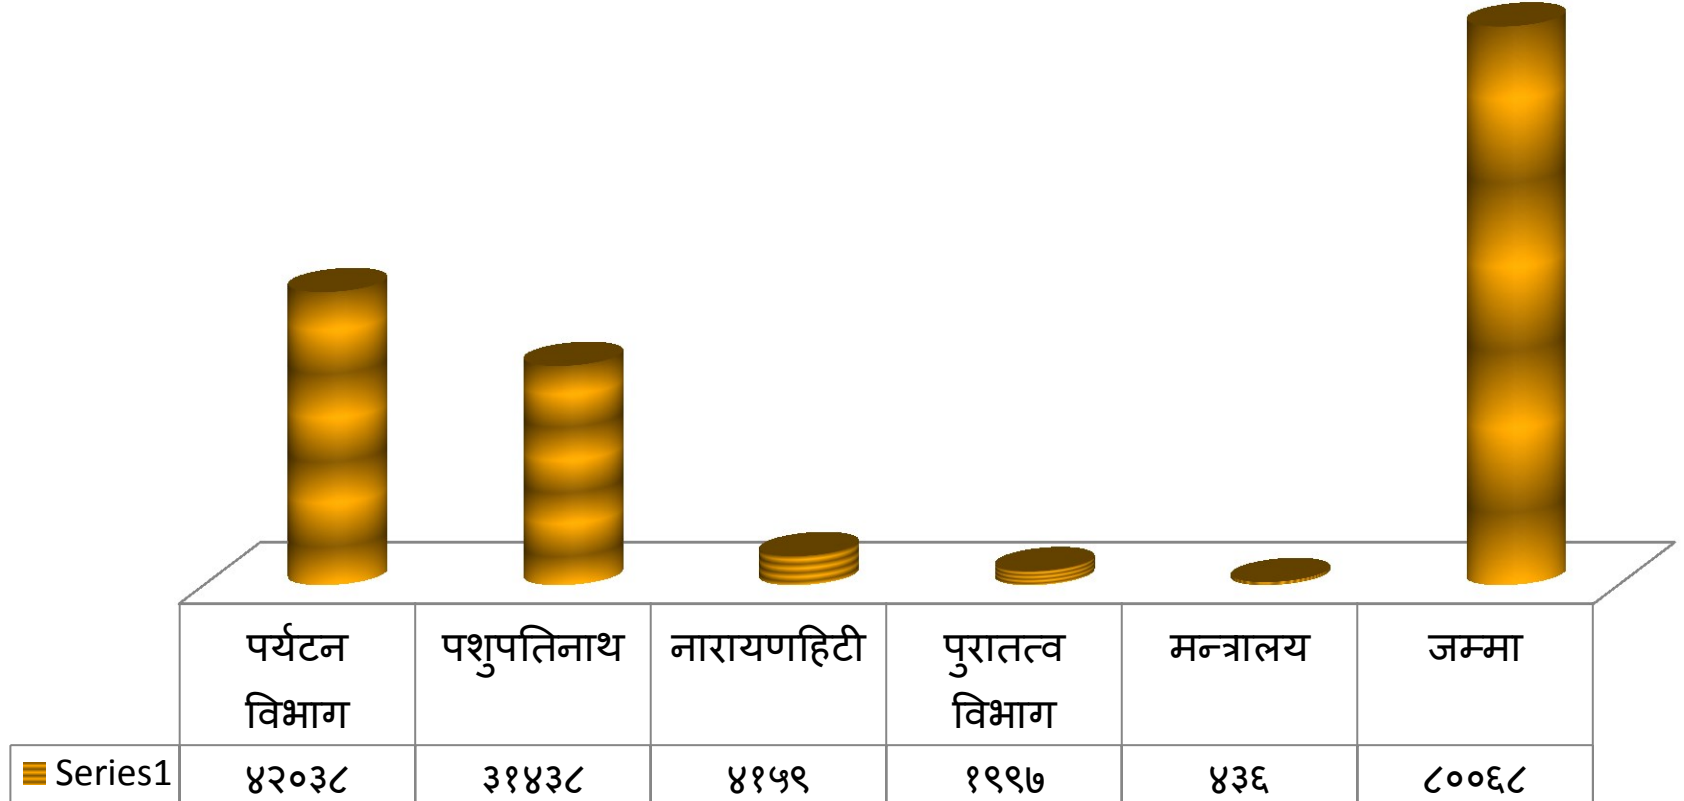




मन्त्रालय अन्तर्गत बेरुजु फछ्यौटको स्थिति



रकम रु. हजारमा

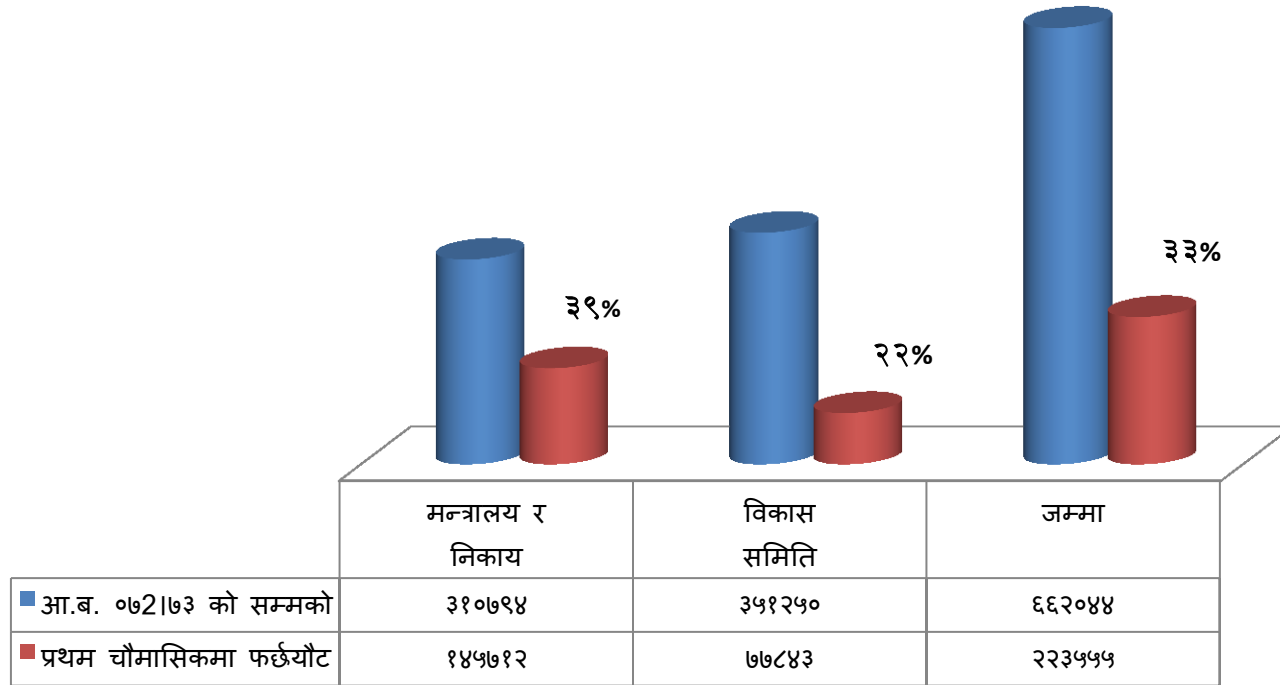



मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०७३ भाद्र २३) को निर्णयहरूको प्रगति स्थिति



निर्णय	कार्य प्रगति
१. मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान तथा समितिहरूले निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्यमा महत्वका साथ कार्य गर्ने ।	महत्वका साथ कार्य भैरहेको ।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको लागि Dedicated Feeder को व्यवस्था गर्न निर्णय भए बमोजिमको पत्र प्राप्त हुने जानकारी भएकोले आयोजनाले उक्त पत्र प्राप्त गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।	पत्र प्राप्त भई इस्टिमेट सहित टेण्डर आव्हानको प्रक्रियामा रहेको ।



मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०७३ भाद्र २३) को निर्णयहरूको प्रगति स्थिति...



निर्णयबट	कार्य प्रगति
४. हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र विस्तारको काम गरिरहेको निर्माण व्यवसायी कम्पनीबाट निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्ने देखिएकोले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिई अविलम्ब विमानस्थल निर्माण कार्यको सुनिश्चितताको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रालय समेतको सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।	• ठेक्काको Termination को कार्य सम्पन्न भएको
५. मन्त्रालय तथा निकायहरूले दिने सेवाहरूका सम्बन्धमा नागरिक वडापत्रमा उल्लेख गरी सबै सेवाग्राहीहरूलाई सुसूचित गराउने ।	• बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याईएको, सुचना अधिकारी तोकिएको ।



मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (२०७३ भाद्र २३) को निर्णयहरूको प्रगति स्थिति...



निर्णय	कार्य प्रगति
६.देशका निषेधित क्षेत्रहरूमा पर्यटकको भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूले सवै क्षेत्रमा सहज रूपमा विना रोकटोक पदयात्रा गर्ने व्यवस्थाका लागि पर्यटन विभागले आवश्यक प्रक्रिया अगाडी वढाउने ।	पत्राचार भै रहेको ।
७.नेपाल वायु सेवा निगमको लागि जहाज थप गर्ने सँग सम्बन्धित आवश्यक सवै प्रक्रियाहरु पारदर्शि ढङ्गले तयार गरी जहाज थप गर्ने कारवाही नेपाल वायु सेवा निगमले अघि वढाउने ।	प्रकृया अगाडि बढेको ।
८.सवै क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुननिर्माण कार्यहरु थालनी तथा निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट बजेट रकम निकाशा प्राप्त भएपछि पुरातत्व विभागले कार्य योजना तयार पारी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।	कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्विकृत भई सकेको । प्राप्त बजेट अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको



राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७ औं बैठक (२०७३।५।२७) को निर्णयहरुको प्रगति स्थिति



निर्णय/निर्देशन	कार्य प्रगति
१. निश्चित सूचक विकास गरी विभागीय प्रमुख, प्रथम प्राथमिकतामा रहेका आयोजना प्रमुख र सार्वजनिक वा स्वायत्त निकायका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने ।	माननिय मन्त्रीज्य र सचिवज्यू बीच श्रीमान् सचिवज्यू र विभागीय प्रमुख र महाशाखा प्रमुखज्यू बीच कार्य सम्पादन करार भएको ।
२. मन्त्रालय तहमा सम्बन्धित माननीय मन्त्री र सचिवले नै प्रमुख आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने र स्थलगत रुपमै समस्या समाधान तथा आवश्यक कारवाही गरी आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने ।	महत्वपूर्ण समस्या रहेको यस्ता आयोजनाहरुमा अनुगमन हुंदै गरेको



राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७ औं बैठक (२०७३।५।२७) को निर्णयहरुको प्रगति स्थिति



निर्णय/निर्देशन	कार्य प्रगति
३.काम भइसकेपछि समयमै रकम भुक्तानी दिने र यसरी भुक्तानी भए नभएको अनुगमन गर्न जानेले अनिवार्य रुपमा हेरी प्रतिवेदन दिने ।	भुक्तानीमा समस्या नदेखिएको । अनुगमन पश्चात प्रतिवेदनहरु प्राप्त नभएको ।
४.मन्त्रालयहरुमा रहेका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा तथा शाखाहरुलाई सोधन स्रोत उपलब्ध गराई सुदृढ गर्ने र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यमा लगाउने ।	राष्ट्रिय योजना आयोगबाट संचालित कार्यक्रमहरुमा सक्रियता पूर्वक भाग लिएको ।



राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७ औं बैठक (२०७३।५।२७) को निर्णयहरुको प्रगति स्थिति



निर्णय/निर्देशन	कार्य प्रगति
५.आयोजना तर्जुमा गर्दा अनुगमनसम्बन्धी क्रियाकलाप समावेश गर्ने र यसलाई आयोजना व्यवस्थापनकै अभिन्न अंगका रुपमा आत्मसात् गर्न लगाउने ।	अनुगमनको योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
६.अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरु सबै निकायले अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने ।	यो प्रकृया अपनाउन नसकिएको ।
७.मन्त्रालय तथा निकायहरुले पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	बजेट विनियोजित भएको आयोजना कार्यान्वयनमा गएको । पुनःनिर्माण आयोजनालाई बहुवर्षीय प्रणालीमा लगिएको ।



मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका समस्याहरु



समस्या	समाधानका उपाय
कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको पर्याप्त जनशक्ति नहुनु	दरबन्दी अनुसारका पदपूर्ति छिटो हुनुपर्ने
एउटा योजनामा एकभन्दा बढी स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले दबाब सृजना गर्नु ।	कार्यक्रम निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकाय/संस्था/उपभोक्ता समिति खुलेको हुनुपर्ने ।
धेरै निकायमा धेरै पटक र धेरै थरी ढांचामा प्रतिवेदन गर्नु पर्दा कागजात तयार गर्नमा बढी समय खर्च हुने अवस्था देखिएको ।	एकिकृत प्रतिवेदनको ढांचा तयार हुनु पर्ने ।
एक पटक मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजित भएपछि कार्यक्रमको कार्यान्वयनको चरणमा पटक पटक विभिन्न अवस्थामा अन्य निकायसंग अनिवार्य रुपमा परामर्श गर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई कुनै काममा पनि पूर्ण जिम्मेवार नठानिने देखिएको ।	आफ्नो मातहतका कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयलाई निर्णायक बनाउनु पर्ने ।



मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका समस्याहरु क्रमशः



समस्या	समाधानका उपाय
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि Dedicated Feeder को व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट भएतापनि उपकरण आयातमा ढिलाई र अन्य समस्या भएकोले जडान हुन नसकेको ।	यथाशक्य छिटो जडान गरिदिनका लागि मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने ।



गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण



धावनमार्ग निर्माण



धन्यबाद्
